


仙台市立中山小学校校舎等増改築工事



工事だより

令和4年7月15日
仙台市立中山小学校
第4号

仮設校舎完成 夏休み明けから使用開始

仮設校舎の建設工事が終了し、学校側へ引き渡されました。夏休み中に、現校舎から仮設校舎への引越を行い、夏休み明け（8月25日）から仮設校舎での生活を始めます。

夏季休業中、夏季休業後の主な工事予定

7月27日（水）～ 校庭の仮囲い撤去、遊具撤去、現校舎エアコンの仮設校舎への移設工事開始（※1）

8月5日（金）
8日（月）
9日（火）

引越業者による引越作業

8月9日（火）
10日（水）

LAN 及び電話移設工事（※2）

8月25日（木） 登校開始

9月1日（木） 第1期解体工事開始（この日から、校庭に解体工事用の仮囲い設置と敷地西側の倉庫の撤去工事開始）


※1・・・コンビネーション遊具は、現状のままの移設ができないため、ジャングルジムと滑り台のみを仮設校舎東側に移設します。残りの部分は、体育館北側に保管し、新校舎完成後に今の場所に復旧します。なお、ブランコと高鉄棒は使用可能です。

※2・・・学校への電話が通じない時間帯が発生します。御了承ください。

8月25日（木）以降の登下校ルートと工事エリアについて（裏面参照）

9月から始まる解体工事は、現在の校舎側が工事エリアとなります。工事エリアの変更に伴い、主に登下校に関して次のとおりとします。

- 1 正門と北門が使えなくなります。（正門は工事車両の出入り口となり、北門は閉鎖します）正門と北門を利用している児童は、仮設門（2で説明）か保育所側の門のいずれかを利用するようにしてください。
- 2 歩行者と車輛が南門を同時に使用することがないように、敷地西側フェンス（災害時給水栓付近）に仮設門を設置し、正門を利用している児童の登下校門とします。なお、南門は、車輛の通行専用とします。
- 3 保育園側の門が使えるようになります。

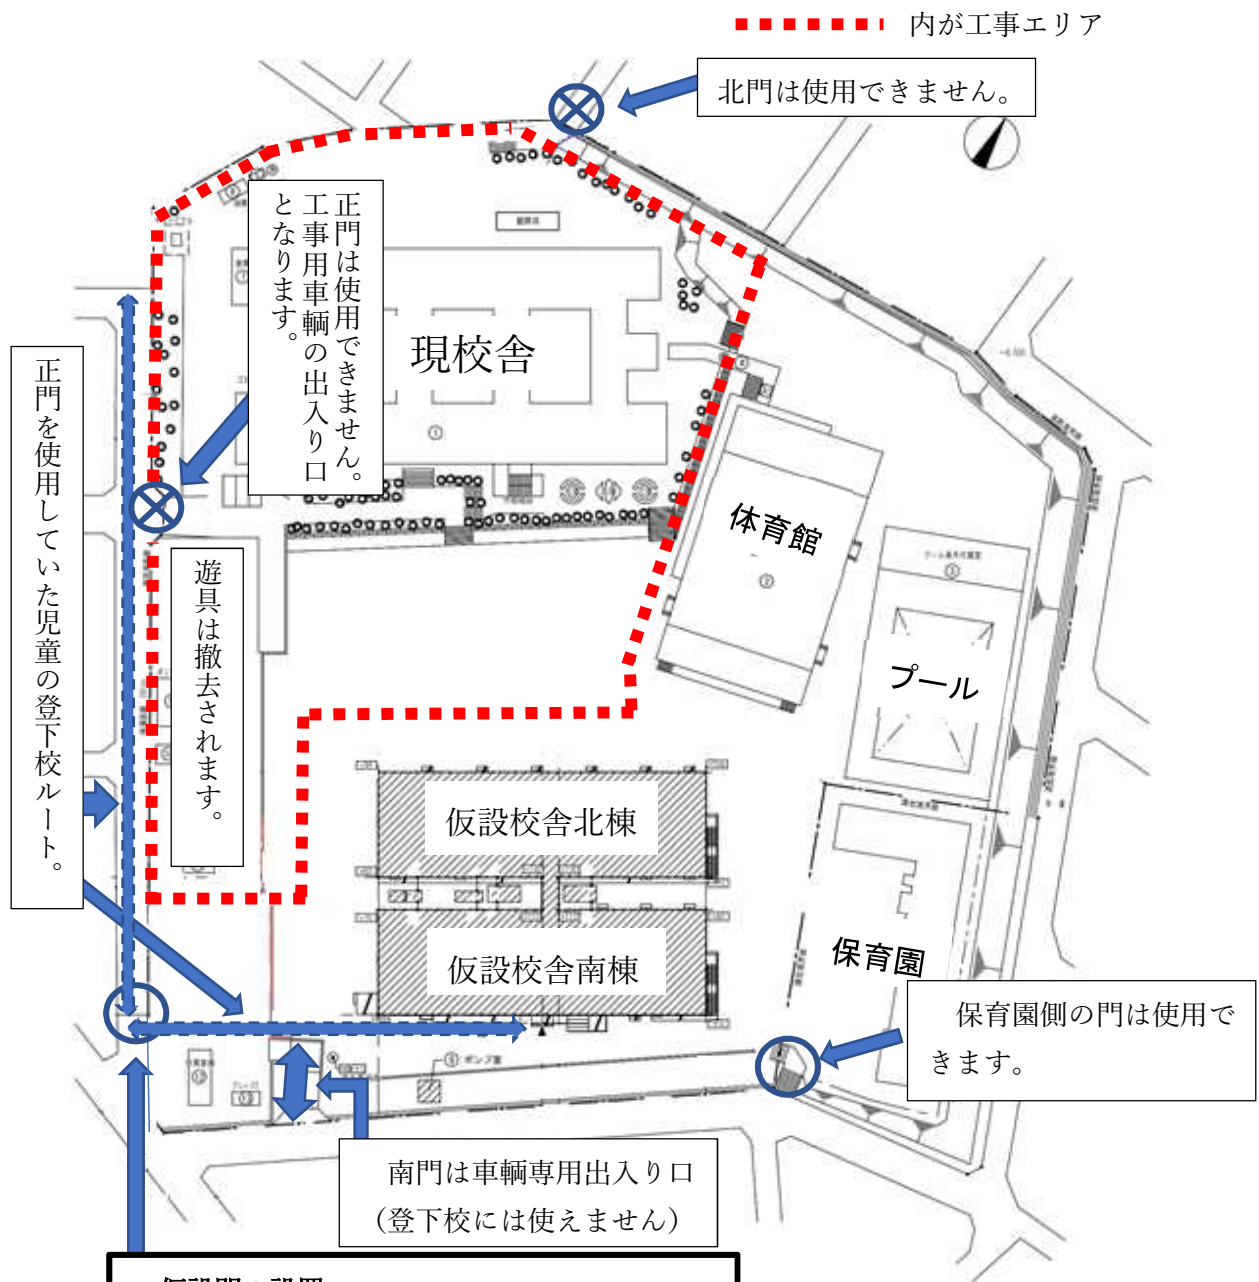

仮設門の設置
 西側フェンスの一部に仮設門を設置し、正門を利用して登下校している児童の登下校に使用します。

夏休み明けの8月25日(木)からは、仮設門か保育園側の門を使って登下校するように指導します。御家庭でもお声がけください。特に、登下校ルートが変わる場合は、夏休み中にどのルートを通るか、お子さんと確認をしてください。よろしくお願いいたします。
